


# PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A.

Ritardi medi di pagamento della P.A. rispetto alla data stabilita di pagamento

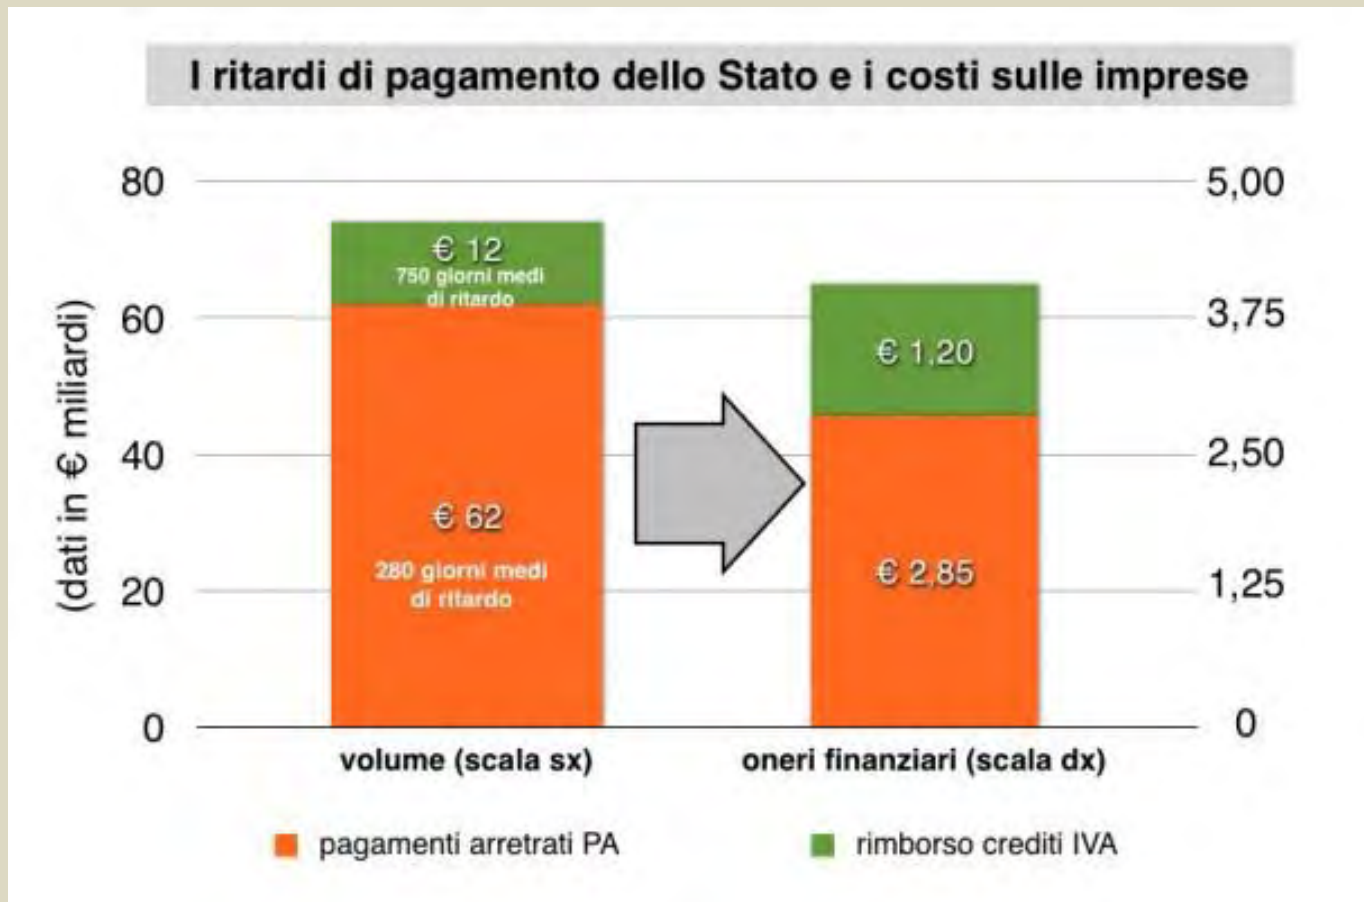

# PAGAMENTI DA PARTE DI L.T.F.

## Tempi medi di pagamento di LTF all'ATI Martina/Italcoge e Martina/Italcostruzioni

Periodo 11/05/2011 (27/6/2011) – 16/4/2012

FASI ESECUTIVE			STATO AVANZAMENTO LAVORI				CERTIFICATI DI PAGAMENTO		
n	inizio	fine	data	SAL n	Lavori a tutto il	Importi	data	n importo	cumulato
1	28/06/2011	30/06/2011	21/06/2011	1	31/05/2011	€ 328.084,10	23/06/2011	1 € 326.443,68	€ 326.443,68
2a	02/08/2011	06/08/2011	29/07/2011	2	30/06/2011	€ 655.010,79	01/08/2011	2 € 325.292,06	€ 651.735,74
2b	16/08/2011	18/08/2011	02/09/2011	3	02/08/2011	€ 1.138.871,30	05/09/2011	3 € 481.441,20	€ 1.133.176,94
3	24/08/2011	26/08/2011	28/09/2011	4	31/08/2011	€ 1.640.483,02	03/10/2011	4 € 499.103,66	€ 1.632.280,60
			12/10/2011	5	30/09/2011	€ 1.796.724,12	13/10/2011	5 € 155.459,90	€ 1.787.740,50
								<b>€ 1.787.740,50</b>	

FASI ESECUTIVE			STATO AVANZAMENTO LAVORI				CERTIFICATI DI PAGAMENTO		
FASE	inizio	fine	data	SAL n	Lavori a tutto il	Importi	data	n importo	cumulato
Raddoppio recinz rea cancelli 5 e 6	01/10/2011	03/10/2011	09/12/2011	1	31/10/2011	€ 506.221,96	15/12/2011	1 € 503.690,85	€ 503.690,85
Impianto illuminazione	04/10/2011	24/11/2011	01/01/2012	2	30/11/2011	€ 940.146,30	12/01/2012	2 € 431.754,72	€ 935.445,57
Impianto idrico	17/10/2011	30/11/2011	03/02/2012	3	31/12/2011	€ 1.336.631,49	06/02/2012	3 € 394.502,76	€ 1.329.948,33
Bitumatura strade di cantiere	18/10/2011	21/10/2011	02/03/2012	4	31/01/2012	€ 1.621.041,71	05/03/2012	4 € 282.988,17	€ 1.612.936,50
Tratto di prova muro prefabb c.a.	15/12/2011	16/12/2011	06/04/2012	5	29/02/2012	€ 2.101.435,72	10/04/2012	5 € 477.992,04	€ 2.090.928,54
Ampliamento recinzione	27/02/2011	28/02/2011	18/05/2012	6	16/04/2012	€ 2.491.225,96	22/05/2012	6 € 378.840,59	€ 2.469.769,13
Protezione traliccio AT	05/03/2012	06/03/2012							
								<b>€ 2.469.769,13</b>	

# PAGAMENTI DA PARTE DI L.T.F.

**Giorni intercorsi tra esecuzione lavori e pagamento di LTF  
all'ATI Martina/Italcoge e Martina/Italcostruzioni**

**Periodo 11/05/2011 (27/6/2011) – 16/4/2012**

## TEMPO INTERCORSO TRA ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTI

Per i lavori fatti dal 5/5/2011 al 31/5/2011 il pagamento è avvenuto il 23/6 cioè dopo gg	23
Per i lavori fatti dal 1/6/2011 al 30/6/2011 il pagamento è avvenuto il 1/8 cioè dopo gg	31
Per i lavori fatti dal 30/6/2011 al 2/8/2011 il pagamento è avvenuto il 5/9 cioè dopo gg	32
Per i lavori fatti dal 2/8/2011 al 31/8/2011 il pagamento è avvenuto il 3/10 cioè dopo gg	33
Per i lavori fatti dal 31/8/2011 al 30/9/2011 il pagamento è avvenuto il 13/10 cioè dopo gg	13

## TEMPO INTERCORSO TRA ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTI

Per i lavori fatti dal 29/9/2011 al 31/10/2011 il pagamento è avvenuto il 15/12 cioè dopo gg	45
Per i lavori fatti dal 31/10/2011 al 30/11/2011 il pagamento è avvenuto il 12/01/2012 cioè dopo gg	43
Per i lavori fatti dal 30/11/2011 al 31/12/2011 il pagamento è avvenuto il 6/2/2012 cioè dopo gg	34
Per i lavori fatti dal 31/12/2011 al 31/01/2012 il pagamento è avvenuto il 5/3/2012 cioè dopo gg	33
Per i lavori fatti dal 31/01/2012 al 29/02/2012 il pagamento è avvenuto il 10/04/2012 cioè dopo gg	40
Per i lavori fatti dal 29/02/2012 al 16/04/2012 il pagamento è avvenuto il 22/05/2012 cioè dopo gg	36
